

MODO SALVADOR

INFORME
AVANCE DE OBRA
SEPTIEMBRE 2026





Fechas Generales de Obra	
Inicio revoque exterior	15 de diciembre 2025
Inicio yeso	25 de marzo 2026
Inicio colocación de ascensor	27 de julio 2026
Inicio colocación de ventanas	15 de agosto 2026

TAREAS POR RUBROS COMPLETAS DURANTE EL MES - AGOSTO 2026

RUBROS	TAREAS
Electricidad	Instalación eléctrica en subsuelo, cableado de todos los departamentos, colocación de tablero de servicios generales.
Sanitarias	Colocación de tanques de reserva y bombeo. Armado de instalaciones sanitarias en subsuelo.
Mampostería	Recuadros de mampostería en piso 12 y amures faltantes en palieres de escaleras. Mampostería, contrapiso y carpeta en subsuelo. Próximas tareas de terminaciones en PB.
Carpinterías	Colocación de barandas de vidrio en balcones pisos 1-10. Comienzo de colocación de ventanas del edificio.
Ventilaciones	Amure de ventilaciones y remate en azotea de presurización de escaleras. Ventilaciones de subsuelo y local.
Impermeabilización	Impermeabilización en primer y azotea en proceso.
Ascensor	Colocación de guías y cabina de ascensor ya realizado. Próximas tareas incluye amure de marcos de ascensores.
Muebles	Comienzo de colocación de muebles de cocina en departamentos.
Aire acondicionado	Preinstalación de aires en subsuelo y local.
Marmolería	Medición de mesadas en baños




INFORME AVANCE DE OBRA - MARZO 2026

Obra: El Salvador 5424

D.D.O. Arq. Brennan Israele

Relevamiento Fotográfico -Agosto 2026

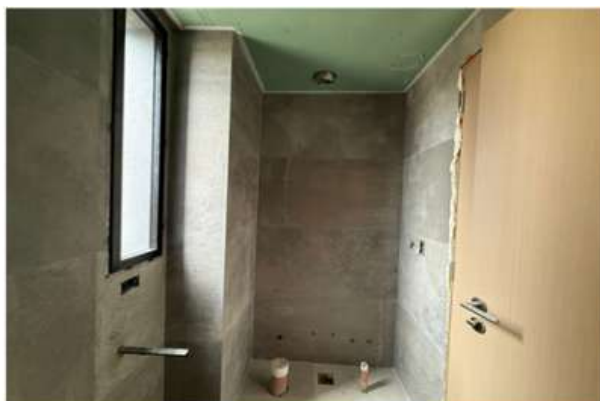



INFORME AVANCE DE OBRA - MARZO 2026

Obra: El Salvador 5424

D.D.O. Arq. Brennan Israele

Relevamiento Fotográfico -Agosto 2026





MODO SALVADOR

CONSTRUYE

COMERCIALIZA

ARQUITECTURA

