




MODDO SOHO

INFORME DE OBRA N°4

Agosto 2024





INFORME DE AVANCE OBRA:

OBRA: Gorriti 4690
D.D.O. Arq. Brennan Israele

FECHAS GENERALES DE OBRA

INICIO DE MAMPOSTERIA	21 de Julio, 2024
CONTINUACION HORMIGON	
ENTRADA SANITARISTAS	4 de Septiembre, 2024
ENTRADA ELECTRICISTAS	4 de Septiembre, 2024

TAREAS POR RUBROS COMPLETADAS DURANTE EL MES

Agosto 2024

RUBROS	TAREAS
Mamposteria	Mamposteria en pisos 1-2. Picado de medianeras y amure de marcos de toilettes piso 1. Muros medianeros en escaleras y pasillos pisos 1-2
Electricidad	Posicionamiento de tablero de obra en pisos 1,2,3 e iluminación general


TAREAS POR RUBRO PROXIMOS 30 DIAS

Septiembre 2024

Mamposteria	Mamposteria en pisos 3-4. Picado de medianeras y amure de marcos de unidades interiores, escaleras y salas de maquinas pisos 1-3. Muros medianeros en escaleras y pasillos pisos 3-4
Electricidad	Comienzo con cajas en mamposteria en pisos 1-2. Realización de instalación eléctrica en losa siguiente.
Sanitaristas	Comienzo con instalaciones sanitarias en baños y ejes sanitarios en cocinas pisos 1-2.

M

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

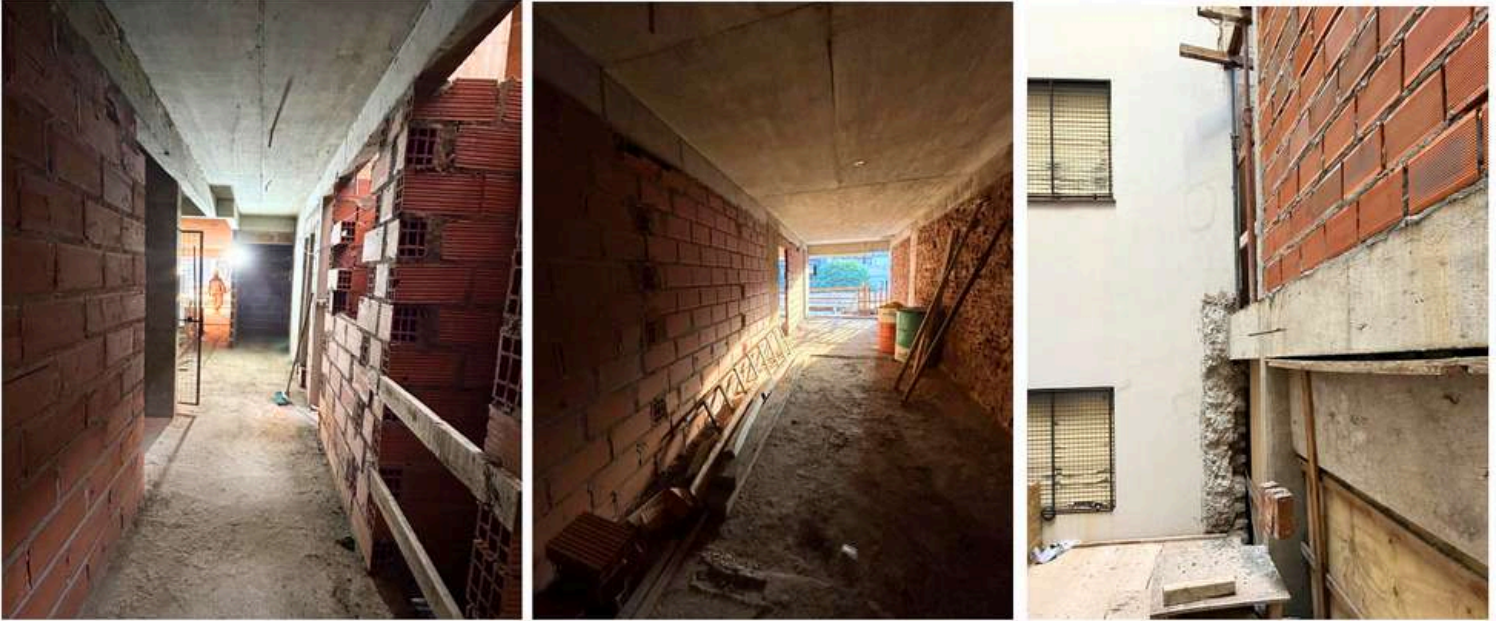

31 de julio de 2024 12:37 p. m.

COMIENZO MAMPOSTERIA

MODO

SOHO
