



INFORMATIVO

JUNHO DE 2026

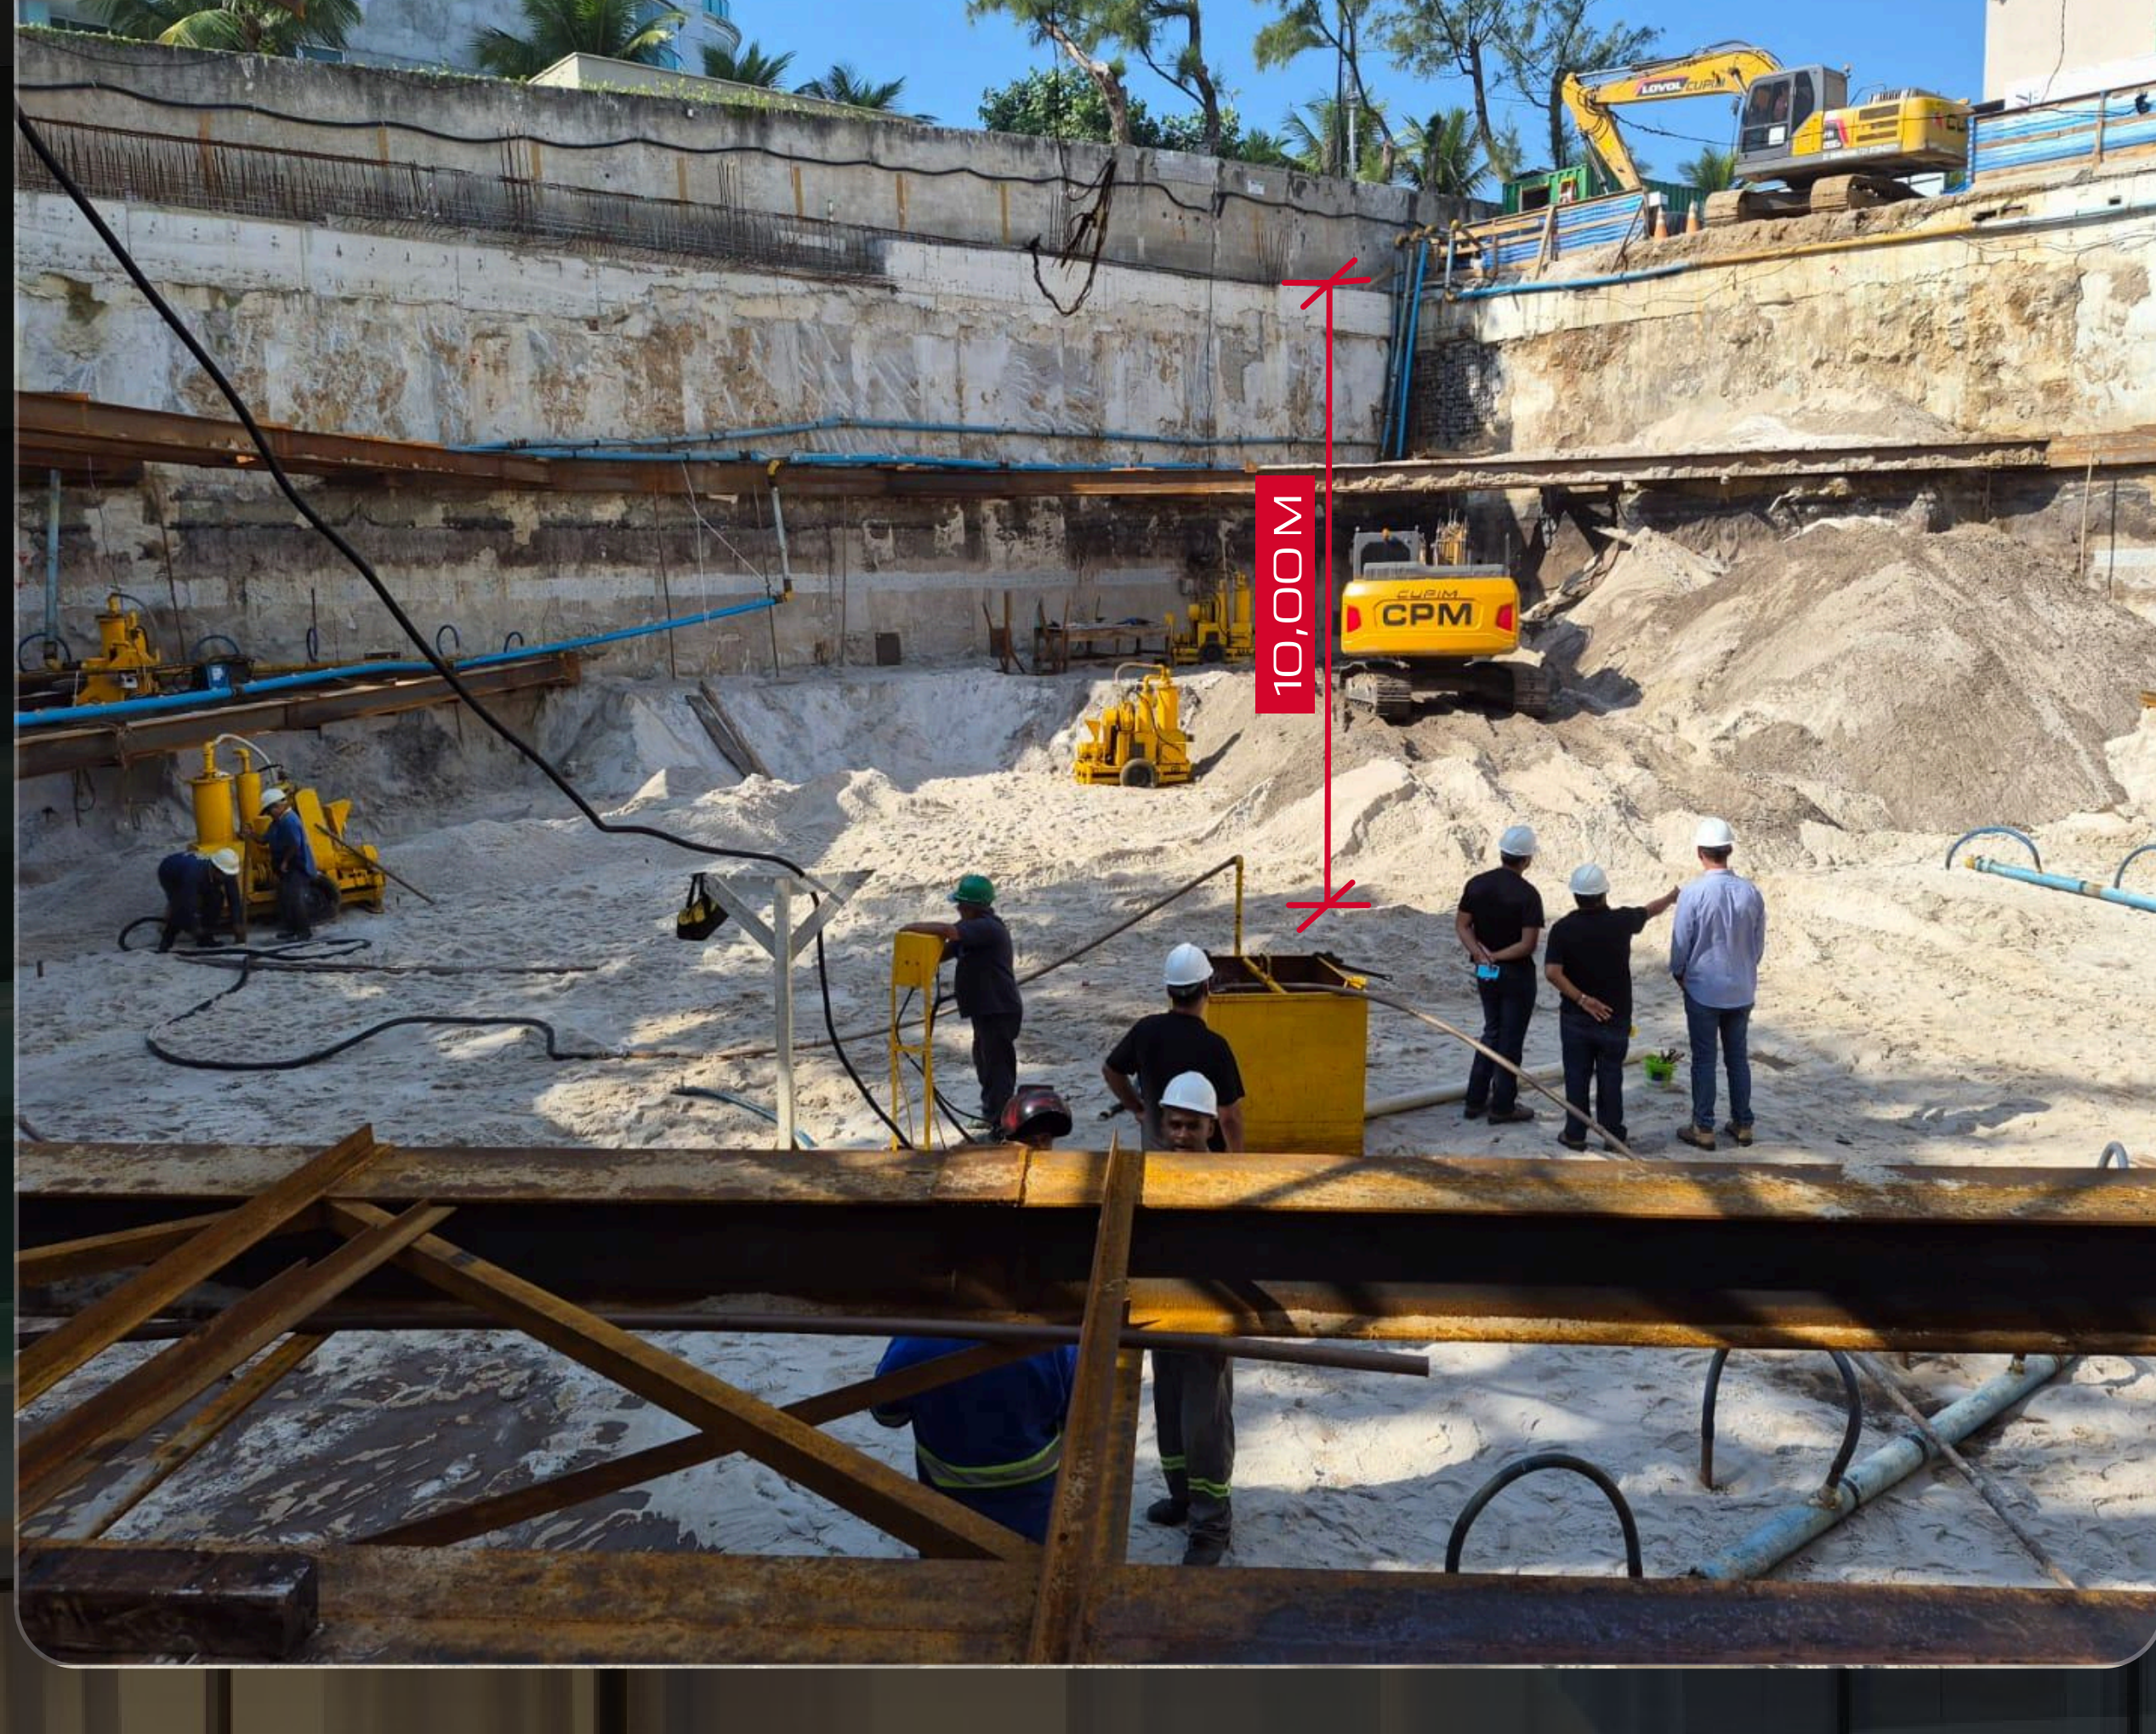

VISÃO GERAL DA OBRA

Durante o mês de junho, avançamos de forma significativa nas atividades de escavação e contenção da obra. A segunda linha do sistema de estroncamento metálico está próxima de ser concluída, permitindo o avanço seguro das escavações para níveis mais profundos.

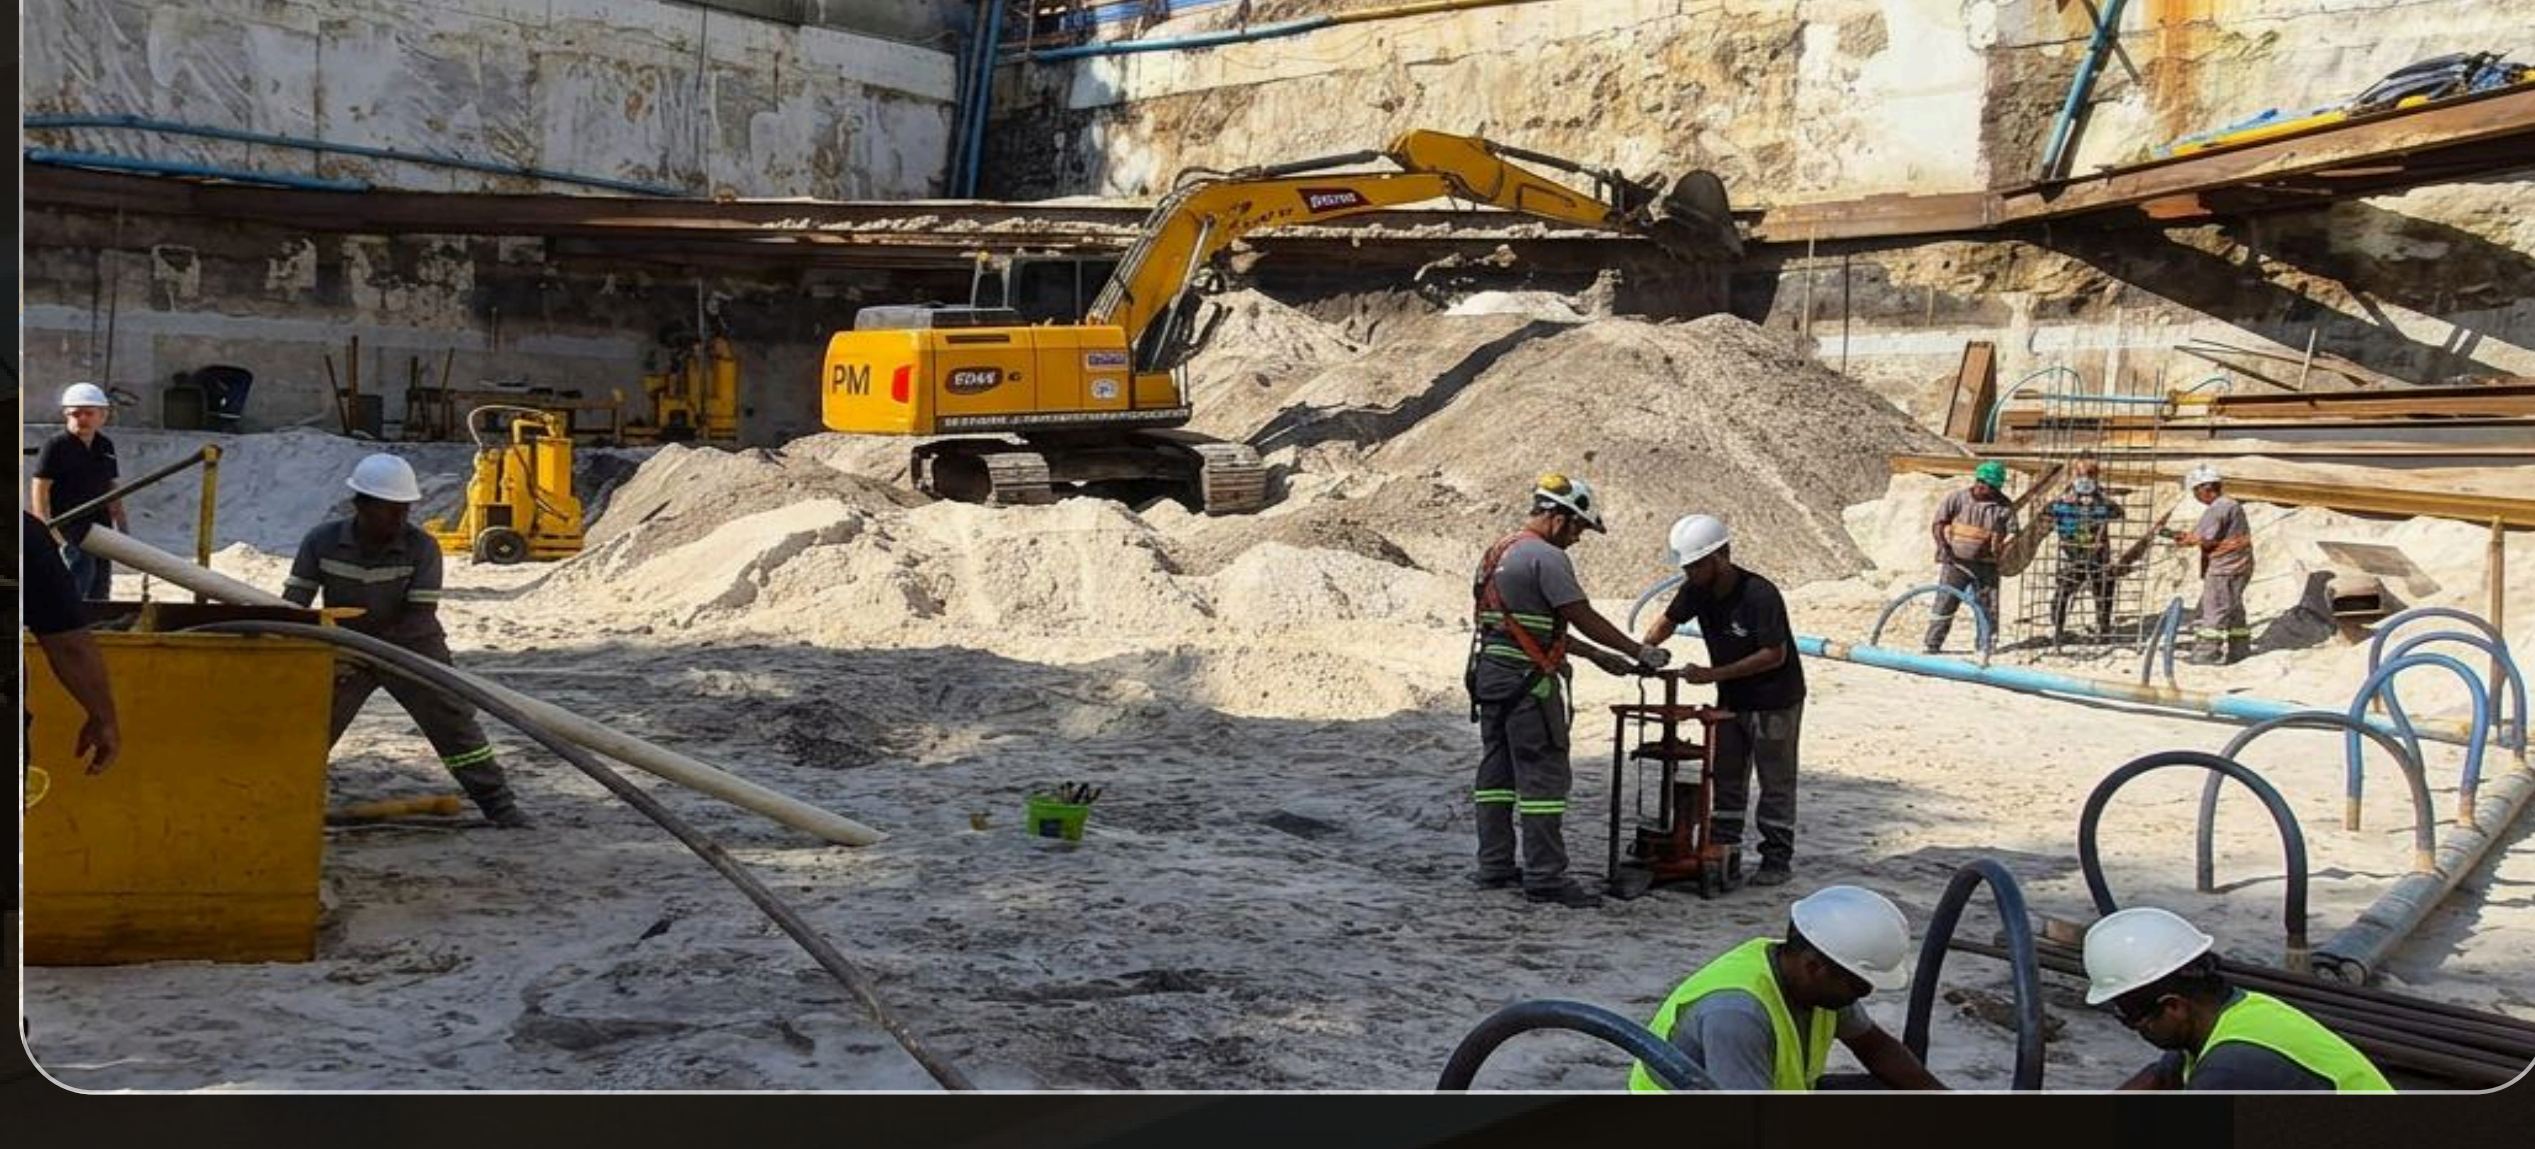

Também tivemos uma evolução importante na escavação mecânica, aproximando a obra do início do ciclo de execução das sapatas de fundação.

Paralelamente, avançamos no rebaixamento do lençol freático e mantivemos o monitoramento contínuo das contenções, garantindo segurança e controle durante a execução dos serviços.

Seguimos avançando, dentro do cronograma, com segurança e consistência, preparando a obra para as próximas etapas do empreendimento.

DATAS MARCO

Previsão de Habite-se

25/11/2027

Previsão de AGI

24/01/2028

HISTOGRAMA DE ATIVIDADES



MOBILIZAÇÃO

100%



DEMOLIÇÕES

100%



CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES

53%



ESTRUTURA

1%



ALVENARIA

0%



REVESTIMENTOS

0%



ACABAMENTOS

0%

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

RIO DE JANEIRO - RJ

[Assista ao vídeo timelapse](#)

ARKT

INCORPORADORA



ARKTINCORPORADORA.COM.BR
